

Abril de 2016

INVERSIONES PICO- LOPEZ 3001, C.A.

Ing. Carlos Povea - T.S.U. Rafael Pico
Especialista de Instalaciones Eléctricas
Especialista de Operaciones Técnicas
INPILOPCA



[INFORME TÉCNICO DE ENTREGA]

**ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE UNA (01) FREIDORA
MARCA: FRYMASTER, MODELO: RE114-2BLCSE EN C.U. SAMBIL**

REQUERIMIENTO


Se realizó visita técnica, guiada por el Líder de Servicios Leonardo López, durante el día lunes veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciseis (2016), a las instalaciones de C.U. Sambil. El requerimiento de Cines Unidos indica la instalación de una acometida eléctrica nueva para la freidora FRYMASTER trifásicas.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

- a. Instalación de acometida eléctrica 208 V trifásica con conductores calibre THW # 8 y breaker de protección 3x50A desde tablero T-DUL-01.
- b. Instalación de tubería EMT ¾" para alimentación eléctrica del equipo.
- c. Instalación de caja 6x6x4 para intemperie.
- d. Instalación de tubería flexible EMT ¾" para conexión hacia el equipo.




Anexo 1 – Freidoras actuales AUTO FRY

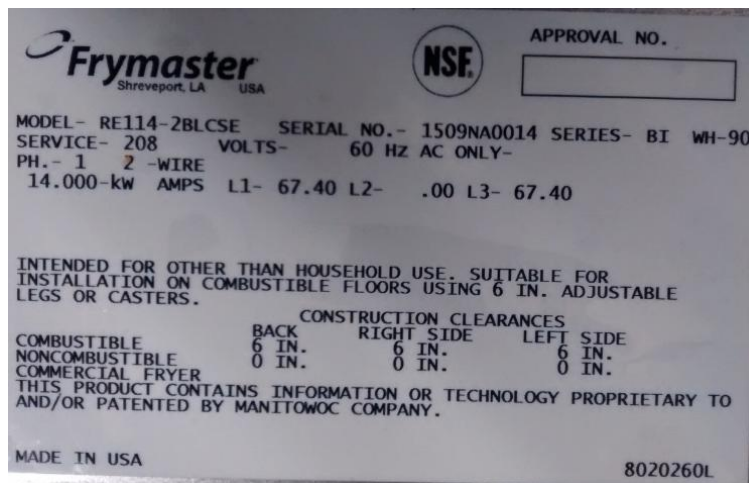

Anexo 2 – Especificaciones técnicas Freidoras FRYMASTER



Anexo 3 – Freidora FRYMASTER

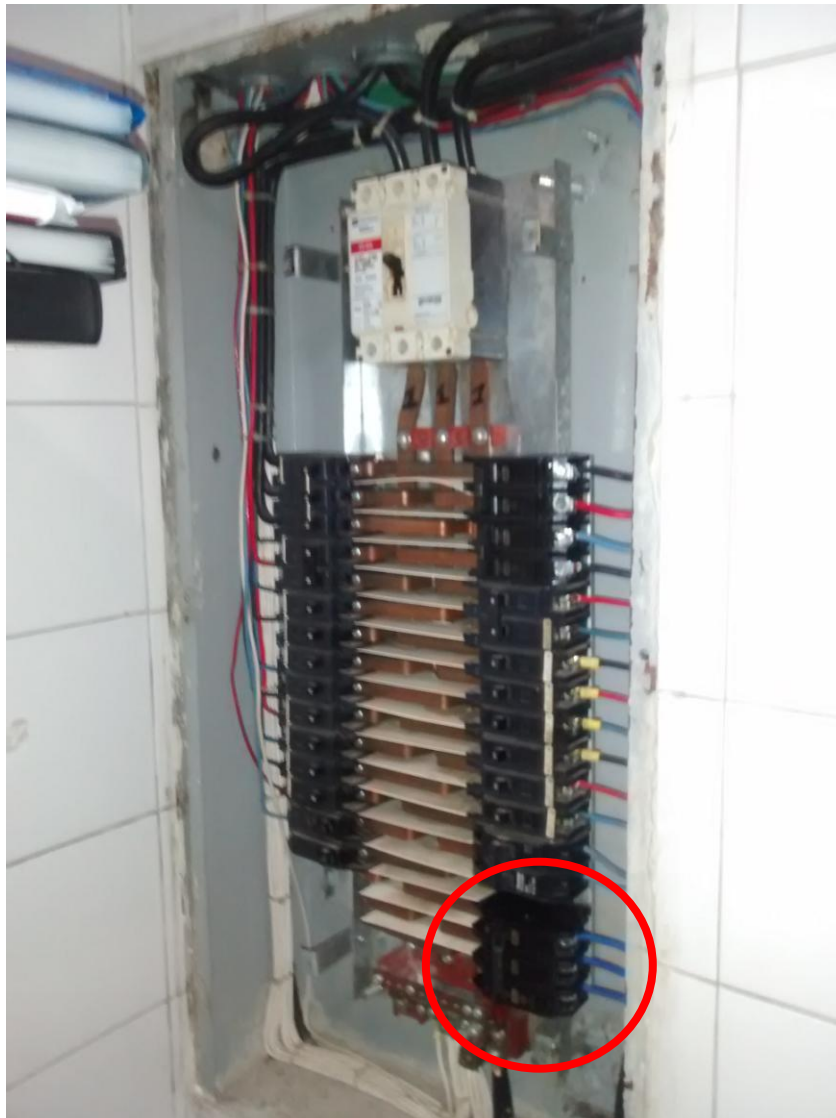

Anexo 4 – Tablero eléctrico: Instalación de breaker 3x40A



Anexo 5 – Tablero eléctrico: Instalación de breaker 3x40A





Anexo 6 – Acometida eléctrica 208V: Ramificación hacia sobre techo



Anexo 7 – Acometida eléctrica 208V: Canalización hacia equipo



Anexo 8 – Acometida eléctrica 208V: Caja de paso y tubería flexible para conexión al equipo.



Sin más a que hacer referencia, se despiden muy cordialmente

EQUIPO DE TRABAJO INPILOPCA

Ing. Carlos Povea

Ing. Hender Arrioja

T.S.U. Rafael Pico

