

Julio 2016

**INVERSIONES PICO-
LOPEZ 3001, C.A.**

Ing. Carlos Povea - T.S.U. Rafael Pico
Especialista de instalaciones Eléctricas -
Especialista de Operaciones Técnicas
INPILOPCA



[INFORME TÉCNICO DE ENTREGA]

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 120V PARA
EQUIPO TMS EN C.U. MILLENIUM**

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Durante el día viernes diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciseis (2016) se realizó visita técnica, guiada por el Arq. Wilser Briceño, a las instalaciones de Cines Unidos Millenium. El requerimiento del cliente establece la instalación de acometida eléctrica 120V para la alimentación del equipo TMS.

FECHA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

El trabajo se desarrolló durante la semana del lunes dieciocho (18) al martes diecinueve (19) de julio del dos mil dieciséis (2016).

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO


- a. Suministro e instalación de dos (02) circuitos independientes 120V 30A, con dos (02) breaker de protección 1x30 A desde el tablero T-AUX 2.
- b. Suministro e instalación de tubería EMT ¾" par acometida eléctrica.
- c. Suministro e instalación de dos (02) tomacorrientes hembra L5-30R y dos (02) cajas condulet ¾" FSC.

- d. Suministro e instalación de un (01) circuito 120V 20A, con breaker de protección 1x20 A.
- e. Suministro e instalación de 2 tomacorrientes 270 cooper y dos (02) cajas condulet $\frac{3}{4}$ " FSC.
- f. Movilización de los dos supervisores de fase 120V y la caja de paso instalados en el depósito contiguo.




Anexo 1 – INSTALACIÓN ACTUAL: Tablero T-AUX 2 para acometida 120 V TMS

Calle la Colina, Edif. Parque los Chaguaramos Torre B 13-3B. Colinas de los Chaguaramos. Caracas - Dtto. Capital. Telf.: 0212-741.29.99 / 0416-535.98.42. Correo electrónico: inpilopca@gmail.com

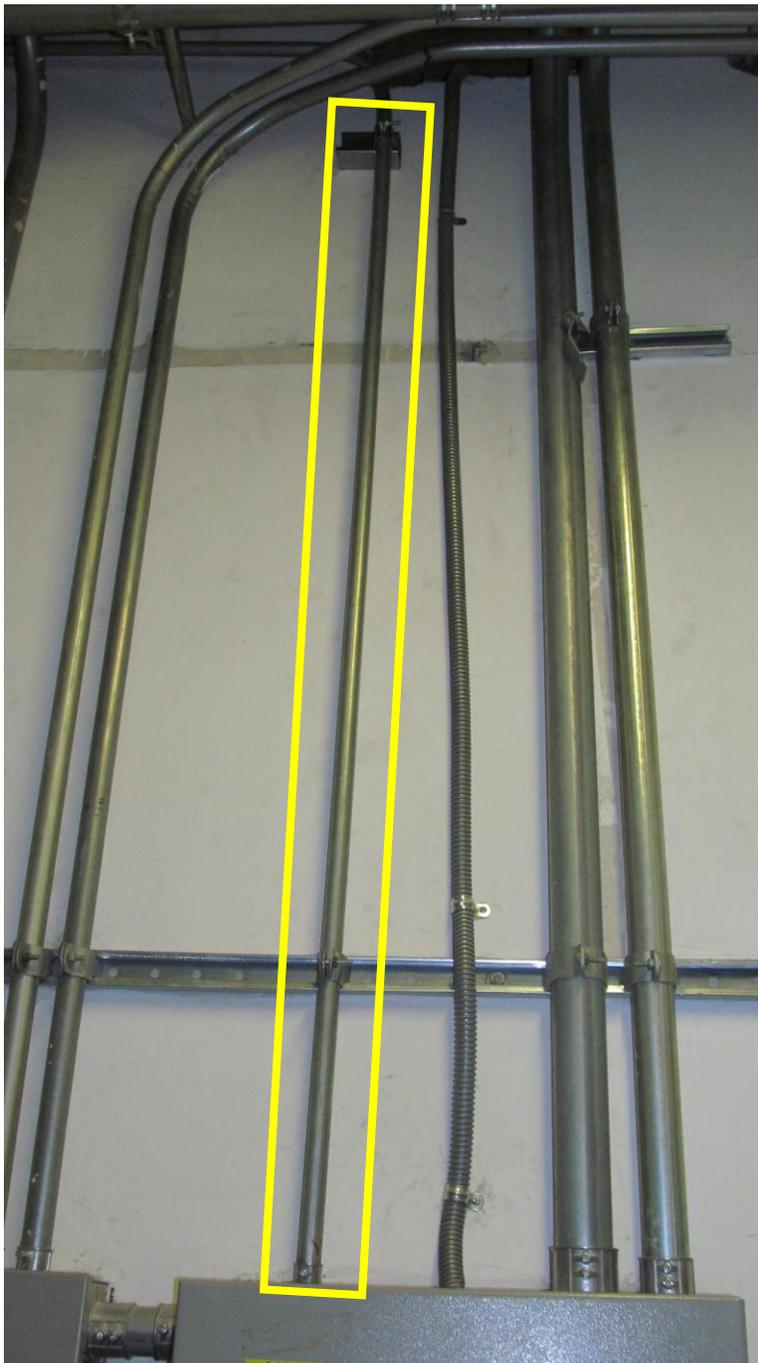


Anexo 2 – **INSTALACIÓN ACTUAL:** Salida desde tablero T-AUX 2 para acometida 120 V TMS

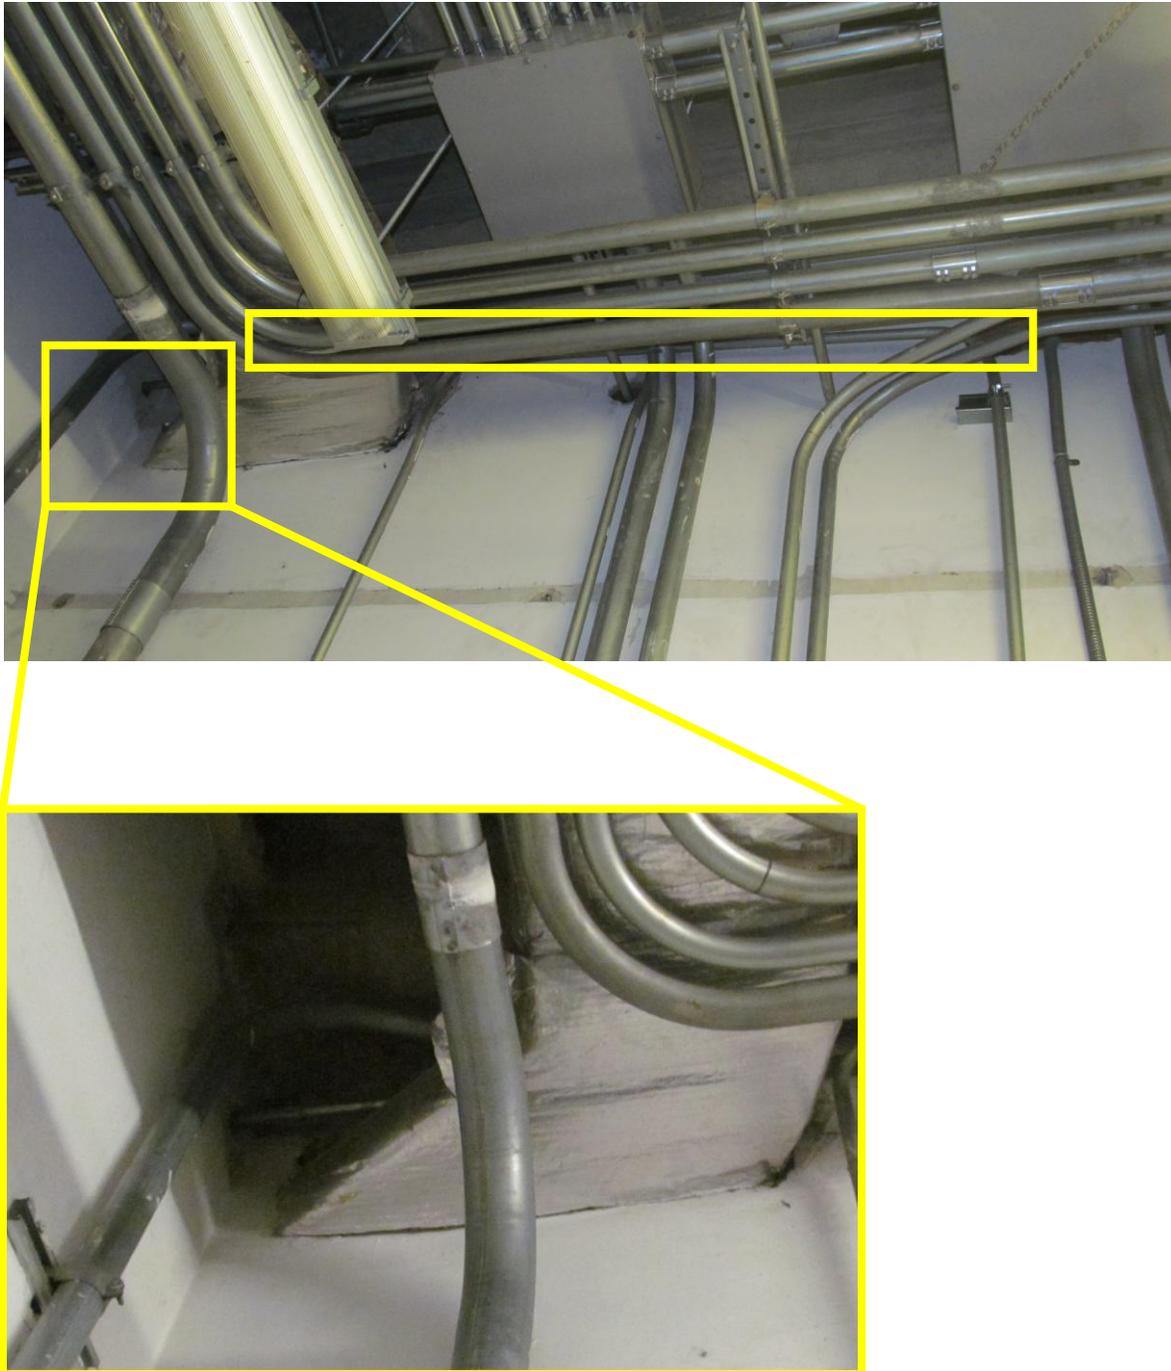

Anexo 3 – INSTALACIÓN ACTUAL: Salida desde tablero T-AUX 2 para acometida 120 V TMS Acceso hacia pasillo.



Anexo 4 – **INSTALACIÓN ACTUAL:** Trayecto de acometida sobre cielo raso.

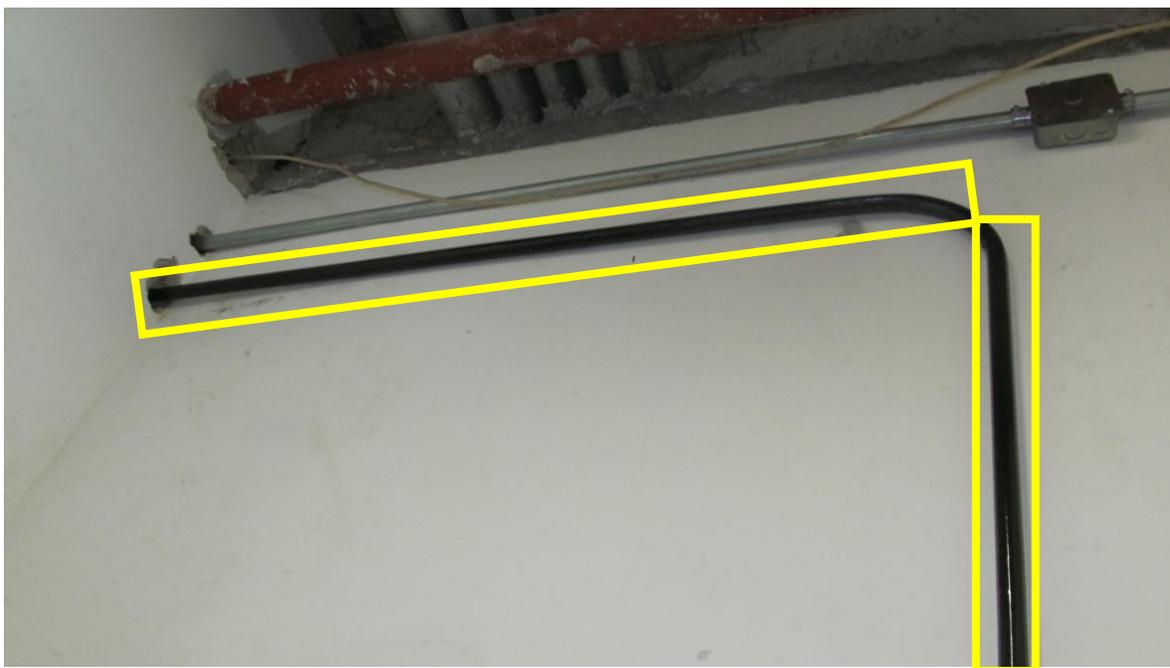

Anexo 5 – **INSTALACIÓN ACTUAL:** Acometida eléctrica en cuarto de TMS.



Anexo 5 – INSTALACIÓN ACTUAL: Acometida eléctrica en cuarto de TMS.

Calle la Colina, Edif. Parque los Chaguaramos Torre B 13-3B. Colinas de los Chaguaramos. Caracas - Dtto. Capital. Telf.: 0212-741.29.99 / 0416-535.98.42. Correo electrónico: inpilopca@gmail.com



Anexo 6 – **INSTALACIÓN ACTUAL:** Medición de salida en supervisor de fase.



Anexo 7 – INSTALACIÓN ACTUAL: Medición de tierra con respecto a neutro



Anexo 8 – **INSTALACIÓN ACTUAL:** Cero del instrumento de medición



Anexo 9 – **INSTALACIÓN ACTUAL:** Tomacorrientes 120 V 270 cooper



Anexo 10 – **INSTALACIÓN ACTUAL**: Tomacorrientes 120 V L5-30R



Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano la colaboración y confianza en nuestro trabajo, se suscriben

Atentamente

EQUIPO DE TRABAJO INPILOPCA

Ing. Carlos Povea

Ing. Hender Arrijoa

T.S.U. Rafael Pico

