Julio 2016

INVERSIONES PICO-LOPEZ 3001, C.A.

Ing. Carlos Povea - T.S.U. Rafael Pico
Especialista de instalaciones Eléctricas -
Especialista de Operaciones Técnicas
INPILOPCA

[INFORME TÉCNICO DE ENTREGA]

REACONDICIONAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CINES UNIDOS METROCENTER

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Durante la mañana del día diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis se realiza visita técnica, guiada por el Gerente del Cine Joel Pelaez, a las instalaciones de Cines Unidos Metrocenter. El requerimiento establece el reacondicionamiento del Tablero eléctrico para control de iluminación del cine motivado a numerosas fallas generadas durante su operación y a la condición insegura que genera a los usuarios su manipulación diaria por poseer sus elementos sin ningún tipo de fijación o soporte.

DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO

1. Evaluación de lógica de control de los sistemas de iluminación involucrados en el tablero eléctrico.
2. Evaluación de la alimentación eléctrica a cada uno de los contactores e independización de dichos sistemas.
3. En el tablero del pasillo hacia gerencia se realizó lo siguiente:
    - Reubicación de cinco (05) contactores y reacondicionamiento de tablero eléctrico.
    - Desincorporación de selector instalado.
4. En el tablero de la oficina de la gerencia se realizaría lo siguiente:
    - Instalación de cinco (05) selectores dos posiciones 22 mm para control de iluminación de áreas.
    - Reorganización de los pilotos instalados para que el frontal genere concordancia.
    - Desincorporación de los selectores instalados y pulsadores instalados.
    - Instalación de regleta para conexión.
5. Prueba de funcionamiento y entrega al responsable por Cines Unidos de los sistemas conectados.

Anexo 1: Tablero de la oficina de gerencia **ANTIGUO**

Anexo 2: Tablero de la oficina de gerencia **ACTUAL**

Anexo 3: Tablero de la oficina de gerencia **ACTUAL**

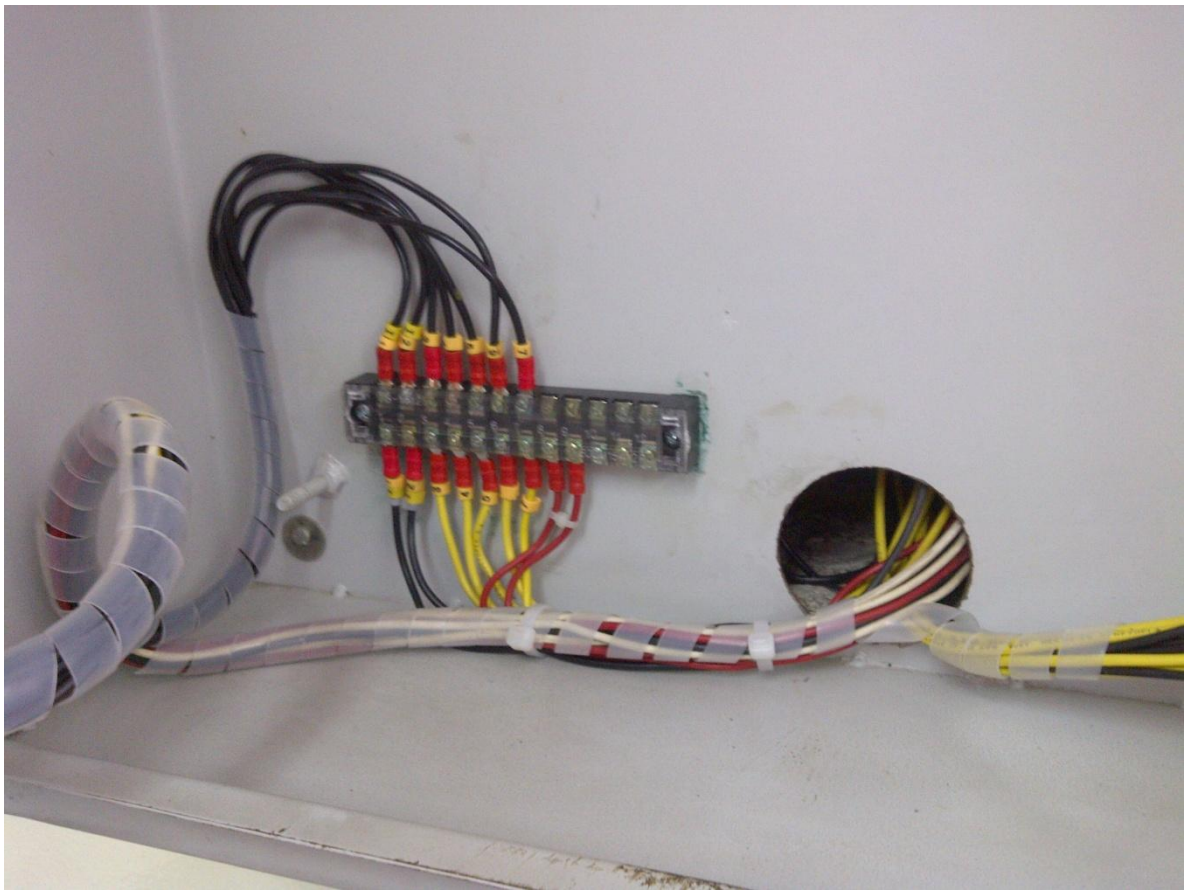

Anexo 4: Tablero de la oficina de gerencia **ACTUAL**

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano la colaboración y confianza en nuestro trabajo, se suscriben

.

Atentamente

EQUIPO DE TRABAJO INPILOPCA

Ing. Carlos Povea

Ing. Hender Arrioja

T.S.U. Rafael Pico
